

# Toekomst parochiekerken


begeleiding Veneco



# aanbod Veneco

- Kennisplatform
- Begeleiding opmaak kerkenbeleidsplan
- Opvolging haalbaarheidsonderzoek Projectbureau


# Kennisplatform

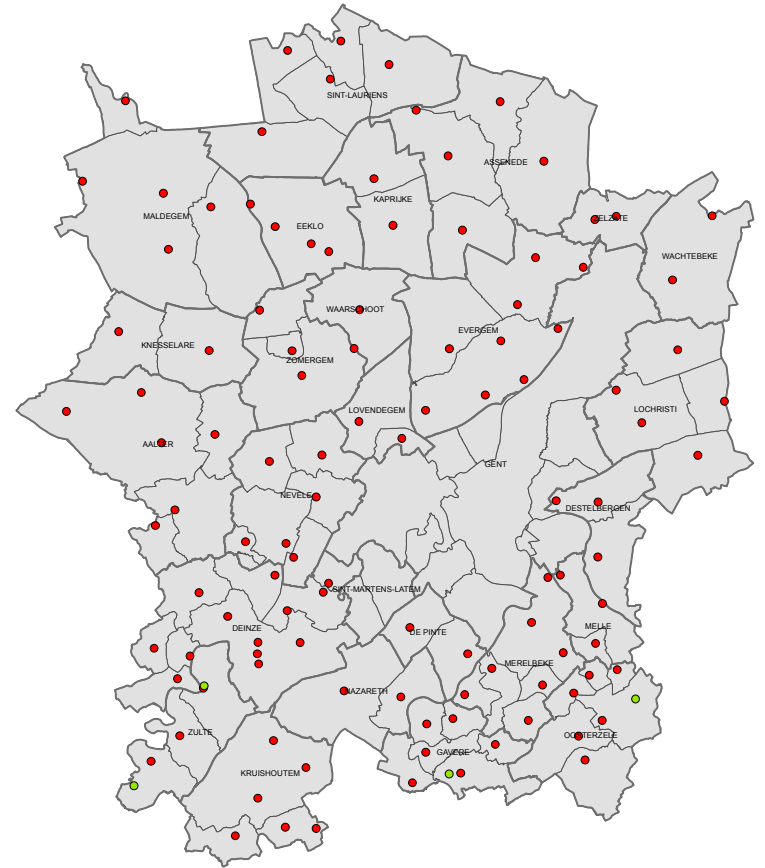

# kennisplatform

- Netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaringen
- 1 aanspreekpunt
- Samenbrengen van betrokken partijen: kerkelijk en burgerlijk
- Organisatie netwerkmomenten, projectbezoeken, gespreksavonden, ...
- Toelichting aan gemeentelijke en kerkelijke verantwoordelijken

# Kerkenbeleidsplan

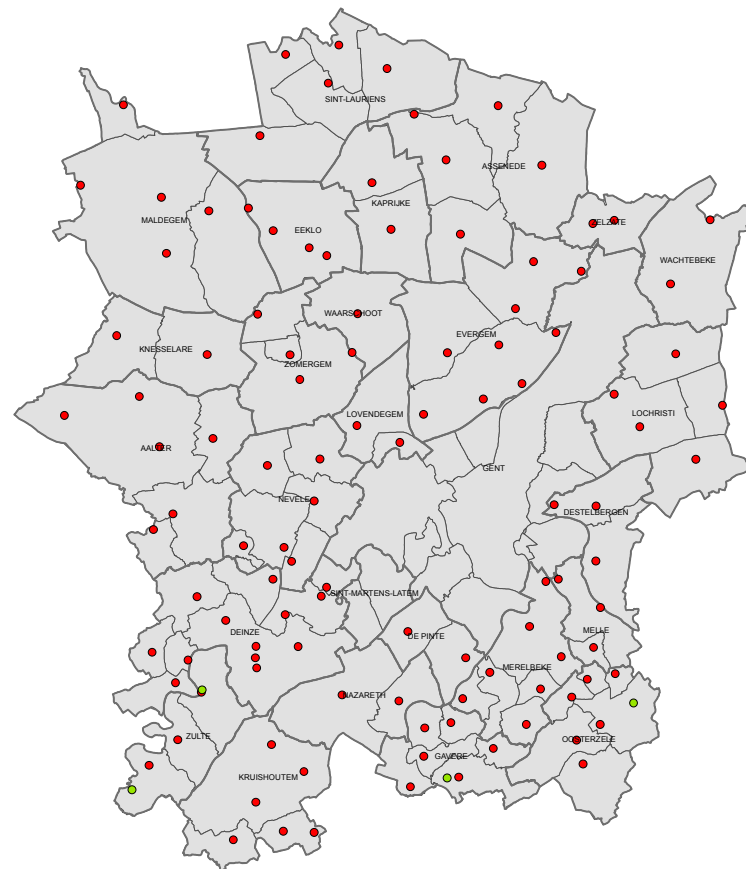

# Kerkenbeleidsplan

= langetermijnvisie op de toekomst van de parochiekerken op grondgebied van de gemeente, tot stand gekomen via overleg tussen kerkelijke verantwoordelijken en gemeente





# Kerkenbeleidsplan

stappenplan



# stappenplan

## 0. voorbereiding



# stappenplan

## 0. voorbereiding

1. pastoraal / dekenaal plan
2. dialoog met de gemeentelijke overheid
3. inventarisatie & consensusvorming
4. consultatieronde ontwerp kerkenbeleidsplan
5. goedkeuring kerkenbeleidsplan

# stappenplan

## 0. voorbereiding

1. pastoraal / dekenaal plan
2. dialoog met de gemeentelijke overheid
3. inventarisatie & consensusvorming
4. consultatieronde ontwerp kerkenbeleidsplan
5. goedkeuring kerkenbeleidsplan

## 6. opvolging en uitvoering

## 7. bijsturing



## Offerte kerkenbeleidsplan

Fase	Taakomschrijving	Uitvoerder	Tijdsbesteding	Kost (€)
0	Organisatie startvergadering	Veneco	1/2 werkdag	0
1	Opstellen pastoraal/dekenaal plan	Dekenaat		
2	Samenstellen kerkelijke werkgroep	Kerkfabriek		
	Samenstellen burgerlijke werkgroep	Gemeente	1/2 werkdag	
	Samenstellen stuurgroep	Veneco	1/2 werkdag	
	Bijwonen bijeenkomsten kerkelijke en burgerlijke werkgroepen	Veneco	1 werkdag (1/2 werkdag per werkgroep)	
	Plaatsbezoek kerken (met verantwoordelijken van de werkgroepen)	Veneco	1 werkdag	
	Voorbereiden en coördineren 1 <sup>e</sup> stuurgroepvergadering	Veneco	1 werkdag	
3	Opmaak pastorale/dekenale inventaris	Kerkfabriek		
	Uitschrijven kerkenportret per kerk	Veneco	1 werkdag/kerk	
	Bijwonen bijeenkomsten kerkelijke en burgerlijke werkgroepen	Veneco	1 werkdag (1/2 werkdag per werkgroep)	
	Voorbereiden en coördineren 2 <sup>e</sup> stuurgroepvergadering	Veneco	1 werkdag	
	Eventueel: Voorbereiden en coördineren extra stuurgroepvergadering	Veneco	1 werkdag	
	Uitschrijven visie kerkelijke werkgroep	Kerkfabriek		
	Uitschrijven visie burgerlijke werkgroep	Gemeente	1 werkdag	
	Uitschrijven gezamenlijke visie	Veneco	1 werkdag	
	Uitschrijven ontwerp parochiekerken plan	Veneco	1 werkdag	
4	Voorbereiden en coördineren infoavond	Veneco	2 werkdagen	
	Verwerken feed-back	Veneco	1 werkdag	
	Afwerken finaal parochiekerkenplan	Veneco	2 werkdagen	
	Voorbereiden en coördineren 3 <sup>e</sup> stuurgroepvergadering	Veneco	1 werkdag	
5	Contact bisdom i.v.m. goedkeuring	Veneco	1/2 werkdag	
	Omzetten kerkenbeleidsplan in gemeenteraadsbesluit	Veneco	1 werkdag	


# 0. voorbereiding

- Organisatie startvergadering met gemeentelijk en kerkelijk bestuur
  - noden? opportuniteiten?
  - stand van zaken
  - toelichting stappenplan

# 1. pastoraal/dekenaal plan

- *Op te maken door pastorale ploeg*

## 2. dialoog

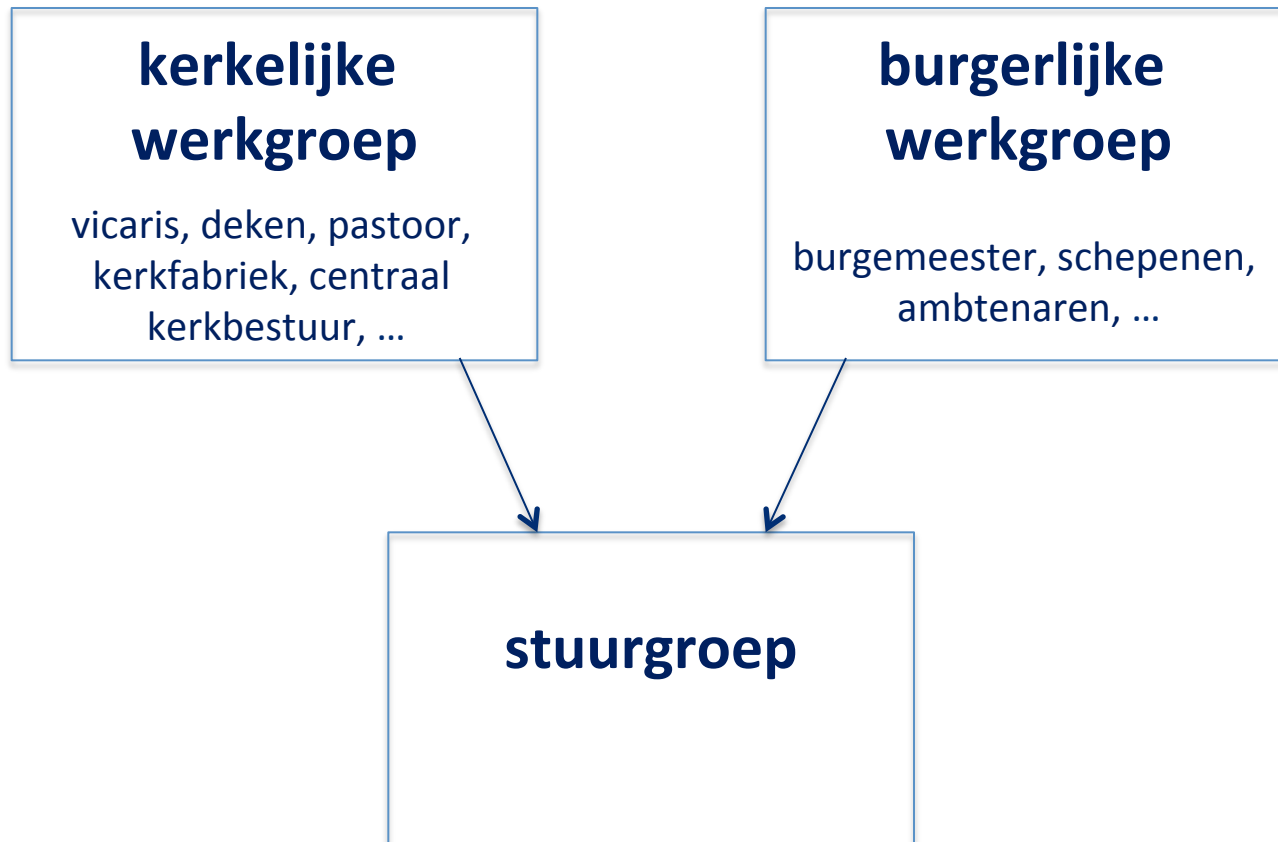

## 2. dialoog

- *Samenstellen kerkelijke werkgroep*
- Burgerlijke werkgroep:
  - samenstellen
  - bijwonen bijeenkomsten tijdens proces
- Stuurgroep
  - samenstellen
  - procesbegeleiding: neutrale moderator



## 2. dialoog

- Voorbereiden en coördineren 1<sup>e</sup> stuurgroepvergadering
  - kennismaking
  - taakverdeling
  - procesverloop

# 3. inventarisatie & consensus

- *Pastorale of dekenale inventaris*
- Opmaak kerkenportret per kerkgebouw
  - eigendomssituatie, erfgoedwaarde, bouwkundige toestand, ...
  - ruimtelijke situering
  - actueel gebruik
  - belangstelling van andere actoren

# 3. inventarisatie & consensus

Voorbereiden en coördineren 2<sup>e</sup> (en eventueel extra) stuurgroepvergadering:

- rapportage inventarissen
- sterkte – zwakte analyse van de kerken
  - sterkten en zwakten per kerk
  - mogelijkheden en opportuniteiten nieuw gebruik
  - op basis van dekenaal/pastoraal plan
- formuleren gemeenschappelijk standpunt

# 3. inventarisatie & consensus

- *Uitschrijven kerkelijke visie*
- Uitschrijven gemeentelijke visie
- Uitschrijven ontwerp kerkenbeleidsplan

## 4. consultatie

- Organisatie “open avond”
  - voorstelling ontwerp kerkenbeleidsplan
  - per gemeente of deelgemeente
  - feedback van het publiek
- Verwerken feed-back
- Afwerken finaal parochiekerkenplan

## 4. consultatie

- Voorbereiden en coördineren 3<sup>e</sup> stuurgroepvergadering
  - bespreking feed-back
  - goedkeuring definitief ontwerp

## 5. goedkeuring

- Contact bisdom i.v.m. goedkeuring
- Omzetten kerkenbeleidsplan in gemeenteraadsbesluit





## Offerte kerkenbeleidsplan

Fase	Taakomschrijving	Uitvoerder	Tijdsbesteding	Kost (€)
0	Organisatie startvergadering	Veneco	1/2 werkdag	0
1	Opstellen pastoraal/dekenaal plan	Dekenaat		
2	Samenstellen kerkelijke werkgroep	Kerkfabriek		
	Samenstellen burgerlijke werkgroep	Gemeente	1/2 werkdag	
	Samenstellen stuurgroep	Veneco	1/2 werkdag	
	Bijwonen bijeenkomsten kerkelijke en burgerlijke werkgroepen	Veneco	1 werkdag (1/2 werkdag per werkgroep)	
	Plaatsbezoek kerken (met verantwoordelijken van de werkgroepen)	Veneco	1 werkdag	
	Voorbereiden en coördineren 1 <sup>e</sup> stuurgroepvergadering	Veneco	1 werkdag	
3	Opmaak pastorale/dekenale inventaris	Kerkfabriek		
	Uitschrijven kerkenportret per kerk	Veneco	1 werkdag/kerk	
	Bijwonen bijeenkomsten kerkelijke en burgerlijke werkgroepen	Veneco	1 werkdag (1/2 werkdag per werkgroep)	
	Voorbereiden en coördineren 2 <sup>e</sup> stuurgroepvergadering	Veneco	1 werkdag	
	Eventueel: Voorbereiden en coördineren extra stuurgroepvergadering	Veneco	1 werkdag	
	Uitschrijven visie kerkelijke werkgroep	Kerkfabriek		
	Uitschrijven visie burgerlijke werkgroep	Gemeente	1 werkdag	
	Uitschrijven gezamenlijke visie	Veneco	1 werkdag	
	Uitschrijven ontwerp parochiekerken plan	Veneco	1 werkdag	
4	Voorbereiden en coördineren infoavond	Veneco	2 werkdagen	
	Verwerken feed-back	Veneco	1 werkdag	
	Afwerken finaal parochiekerkenplan	Veneco	2 werkdagen	
	Voorbereiden en coördineren 3 <sup>e</sup> stuurgroepvergadering	Veneco	1 werkdag	
5	Contact bisdom i.v.m. goedkeuring	Veneco	1/2 werkdag	
	Omzetten kerkenbeleidsplan in gemeenteraadsbesluit	Veneco	1 werkdag	


## 6. opvolging & uitvoering

- Begeleiding participatietraject herbestemming
  - 1 of meerdere kerken
  
- Begeleiding traject Projectbureau Herbestemming Kerken
  - ontwerpend onderzoek voor neven- of herbestemming
  - gesubsidieerd

## 7. bijsturing

- Bijsturing mogelijk op basis van veranderende realiteit
  - wijziging pastorale noden / functies kerkgebouwen
  - vaststelling van nood aan publieke ruimte waarvoor een bepaalde kerken een oplossing zou kunnen bieden
- In overleg tussen kerkelijke en burgerlijke verantwoordelijken

# Projectbureau

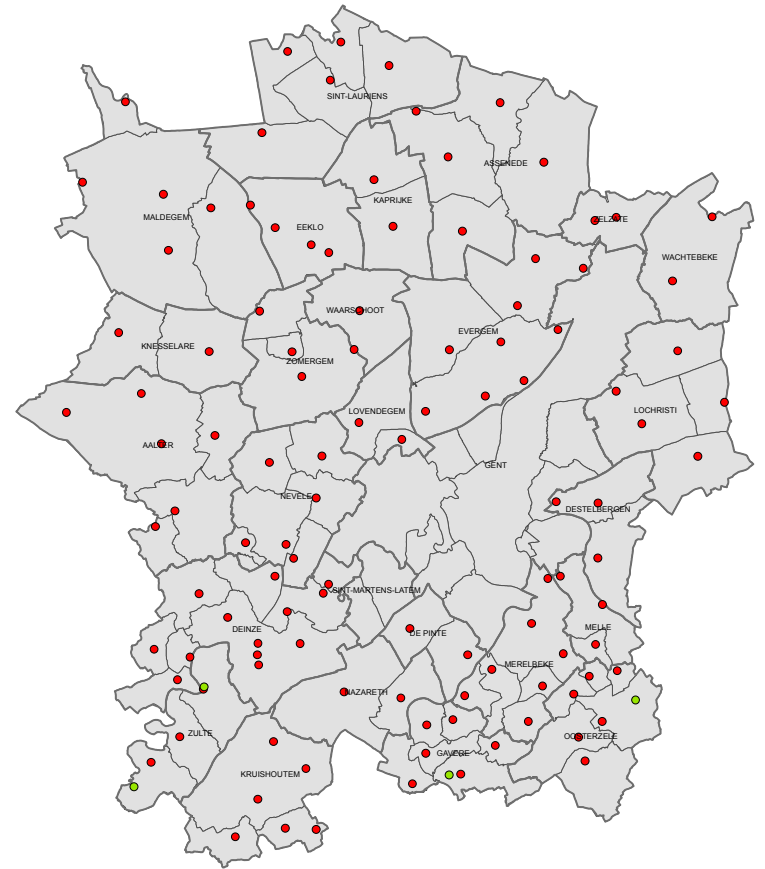


# projectbureau

- Opvolging haalbaarheidsonderzoek herbestemming
- Bijwonen van overlegmomenten
- Begeleiding vervolgtraject
  - openbare aanbesteding of oproep Vlaams Bouwmeester
  - aanvraag onderzoekspremies (bv. beheersplan)
  - stedenbouwkundige initiatieven (vergunning, RUP, ...)
  - bijkomende studies (akoestiek, stabiliteit, ...)
- Eventueel: begeleiding dossiers die niet door het projectbureau kunnen behandeld worden





16 Boekhoutedorp  
Assenede, Vlaanderen  
Street View - apr. 2010



Google

